

Profesora: Margarita Mondragón Arellano

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

PORTAFOLIO PARA ARQUITECTO FREELANCER

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO

Ingeniería en Computación Inteligente

María Fernanda Barrón Álvarez

Leslie Miroslava Benítez Marín

Leonardo Merino Garfias

Contenido

Introducción	1
1. Resumen Ejecutivo	2
Objetivo	2
Beneficios	2
Costo Estimado.....	2
Duración	2
2. Descripción del Proyecto	3
Problema	3
Objetivo General	3
Alcance.....	3
Stakeholders	4
3. Análisis de Negocio.....	5
Estudio de Mercado.....	5
Competencia	5
Justificación del Proyecto	7
4. Factibilidad	8
Técnica	8
Económica.....	8
Operacional	9
5. Requerimientos	10
Funcionales	10
No Funcionales	10
6. Metodología	11
Metodología selecciona.....	11
Justificación	11
Fases del Proceso	11
7. Estimación de Puntos de Función.....	12
Identificación de ILF (Internal Logical Files)	12
Identificación de EIF (External Interface Files).....	12
Detalle de ILF y EIF	12

Identificación de EI (External Inputs)	13
Identificación de EO (External Outputs)	13
Identificación de EQ (External Queries)	13
Detalle de EI, EO y EQ	13
Cálculo de UFP (Puntos de Función sin Ajustar)	14
Cálculo de TDI y VAF	14
Puntos de función ajustados	15
Estimaciones derivadas	15
Consideraciones:	15
Estimación detallada de costos	16
Costos de desarrollo (Mano de obra)	17
Costos de Infraestructura:	17
Costos de Software y Herramientas:	17
Costos de Hardware	18
Costos de Contenido y Diseño	18
Costos de Capacitación	19
Costos Indirectos	19
Reserva de Contingencia	19
Costos Operativos Anuales (Post-Lanzamiento)	20
Resumen General de costos:	20
Costos del proyecto (desarrollo)	20
Precio cobrado al cliente	21
Valor real del proyecto (si se considera manao de obra a precio de mercado)	21
Proyección de Costos a 3 años	21
Comparativa costos vs. Beneficios (3 años)	21
8. Plan de Proyecto	22
EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)	22
Cronograma (fechas, duración, responsables)	25
Sprint 1 (Semanas 1-2): Estructura base del sistema	26
Sprint 2 (Semanas 3-4): Desarrollo del Portafolio Visual	26
Sprint 3 (Semanas 5-6): Catálogo de Servicios	26
Sprint 4 (Semanas 7-8): Sistema de Contacto y Cierre del Proyecto	26

Roles de Equipo	27
9. Ejecución del Proyecto.....	29
Avances Reales	29
Actividades Realizadas	31
Evidencias del Prototipo	34
Trabajo por Sprints	39
Sprint 1 (Semanas 1-2): Estructura base del sistema	39
Sprint 2 (Semanas 3-4): Desarrollo del Portafolio Visual	39
Sprint 3 (Semanas 5-6): Catálogo de Servicios	39
Sprint 4 (Semanas 7-8): Sistema de Contacto y Cierre del Proyecto	40
10. Control del Proyecto (EVM)	41
1. Datos Iniciales del Proyecto (Línea Base).....	41
2. Situación en la Semana 6	41
11. Gestión de Riesgos.....	43
Matriz de Riegos	43
Fichas Técnicas	43
Seguimiento de riesgos	44
12. Gestión de Calidad	45
13. Conclusiones.....	46
Resultados.....	46
Problemas Encontrados	46
Recomendaciones	47
14. Bibliografía.....	48
15. Anexos.....	49

Introducción

En la actualidad, el sector de la arquitectura independiente enfrenta un reto crítico de visibilidad y competitividad derivado de la digitalización del mercado de la construcción. Muchos arquitectos freelancers carecen de una plataforma profesional propia, lo que provoca que la difusión de sus servicios dependa casi exclusivamente de la recomendación directa o "boca a boca", un mecanismo limitado que reduce significativamente su alcance y oportunidades de crecimiento profesional.

El presente proyecto surge como una solución integral a esta problemática mediante el desarrollo de un portafolio digital tecnológicamente optimizado. El objetivo primordial es fortalecer la presencia profesional del arquitecto y facilitar la promoción de servicios de diseño y remodelación a través de la exhibición de renders 3D y visualización de sus proyectos realizados, elementos fundamentales para generar credibilidad y confianza en los clientes potenciales

1. Resumen Ejecutivo

Objetivo

Desarrollar un portafolio digital tecnológicamente optimizado que fortalezca la presencia profesional de un arquitecto freelancer y facilite la promoción de servicios de diseño y remodelación mediante renders 3D y visualización arquitectónica avanzada.

Beneficios

El portafolio digital proporcionará al arquitecto una plataforma profesional para exhibir sus proyectos, reemplazando la dependencia actual del boca a boca como único medio de difusión. Entre los beneficios principales se encuentran: la captación de nuevos clientes a través de presencia digital, el ahorro en material impreso, la reducción de tiempo en presentaciones presenciales, y la mejora significativa en imagen profesional y diferenciación competitiva frente a otros profesionales del sector local.

Costo Estimado

El costo total del desarrollo es de **\$3,000 MXN**, que incluye el diseño, desarrollo, despliegue del sistema, hosting del servidor (\$1,000 MXN) y registro de dominio (\$500 MXN) por el primer año. Los costos operativos anuales a partir del segundo año se estiman en \$2,000 MXN.

Duración

El proyecto tiene una duración estimada de **8 semanas**, organizadas en 4 Sprints de 2 semanas cada uno, siguiendo la metodología Scrum.

2. Descripción del Proyecto

Problema

Actualmente, muchos arquitectos independientes a nivel local carecen de una plataforma digital que les permita presentar sus proyectos de manera integral, profesional y accesible. En el caso específico que aborda este proyecto, el arquitecto freelancer cuenta únicamente con su número telefónico como medio de contacto, sin presencia en redes sociales ni un portafolio digital que respalde y comunique visualmente su experiencia, capacidades y estilo de trabajo.

Esta situación provoca que la difusión de sus servicios dependa casi exclusivamente de la recomendación directa o "boca a boca", un mecanismo limitado que reduce significativamente el alcance, la visibilidad y las oportunidades de crecimiento profesional. La ausencia de un portafolio digital impide mostrar adecuadamente renders 3D, planos técnicos, procesos de diseño y proyectos ejecutados, elementos fundamentales para generar credibilidad y confianza en clientes potenciales.

Objetivo General

Desarrollar un portafolio digital tecnológicamente optimizado que fortalezca la presencia profesional del arquitecto freelancer y facilite la promoción de servicios de diseño y remodelación mediante renders 3D y visualización arquitectónica avanzada.

Alcance

Lo que incluye el proyecto:

- Diseño de la estructura del portafolio digital.
- Desarrollo de un sitio web profesional.
- Creación de secciones: inicio, portafolio de proyectos, galería de renders, servicios, perfil profesional y contacto.
- Integración de imágenes de renders 3D y planos.
- Diseño responsivo para distintos dispositivos.

Lo que no incluye el proyecto:

- Desarrollo de una plataforma de pagos.
- Gestión de redes sociales.
- Producción de renders (solo su exhibición).
- Administración de redes sociales.
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas.

Stakeholders

1. **Arquitecto freelancer (Stakeholder principal):** Usuario directo del sistema y principal beneficiario, quien proporcionará el material gráfico y definirá los contenidos a exhibir.
2. **Clientes potenciales:** Usuarios finales que navegarán el portafolio para evaluar los servicios del arquitecto.
3. **Equipo de desarrollo:** Responsable del diseño, desarrollo e implementación del sistema.

3. Análisis de Negocio

Estudio de Mercado

El crecimiento del trabajo freelance y la digitalización del sector de la construcción han impulsado la demanda de servicios arquitectónicos independientes. Los clientes buscan soluciones visuales que les permitan ver el trabajo del arquitecto para comparar su idea con los acabados y técnicas que maneja, siendo los renders 3D un elemento de ayuda y de los principales factores de decisión.

El análisis del mercado muestra que pocos arquitectos cuentan con sitios web profesionales, optimizados para dispositivos móviles y con galerías interactivas de renders. La mayoría solo hace uso de redes sociales como Facebook o Instagram, e incluso algunas páginas con filtros para buscar arquitectos solo muestran el nombre pero no permiten ver su trabajo.

Competencia

Plan Reforma: Directorio de arquitectos y decoradores con un diseño simple. En las múltiples búsquedas realizadas no arrojó resultados para Aguascalientes. Es un buscador, no un portafolio individual.

The screenshot displays the 'Directorio de Arquitectos en Aguascalientes' page on the Plan Reforma website. The header includes the Plan Reforma logo and navigation links: 'CALCULA Y PIDE PRESUPUESTOS', 'CAJÓN DE IDEAS', 'DIRECTORIO', and 'P3'. A green banner below the header states '+ de 25.000 profesionales contrastados. + de 300.000 clientes satisfechos' and includes a 'Alta profesionales' link and an 'ENTRAR' button. The main heading is 'Directorio de Arquitectos en Aguascalientes'. Below this, a paragraph explains the directory's purpose. A pink button offers to obtain 4 online quotes. The section 'Encuentra tu Arquitecto en Aguascalientes' follows, with instructions on how to use the search. A search bar is provided with the following fields: 'Provincia' (set to 'Aguascalientes'), 'Titulación' (set to 'Arquitecto'), 'Especialidad' (empty), and 'Texto libre' (empty). A green 'Buscar' button is at the bottom of the search section.

Imagen 1. Página principal de "Plan Reforma".

La Construcción Aguascalientes: Catálogo de arquitectos que al seleccionar un profesional solo muestra información de contacto y calificación, pero ninguna muestra de su trabajo.



Imagen 2. Página principal de "la Construcción MX aguascalientes".



Imagen 3. Resultado de Búsqueda de un Arquitecto en "la Construcción MX aguascalientes". No muestra sus proyectos.

STVX Arquitectos: Página que muestra proyectos arquitectónicos, pero no identifica al arquitecto que los realizó ni ofrece su contacto directo. Es más cercana a lo propuesto, pero sigue sin ser un portafolio individual.

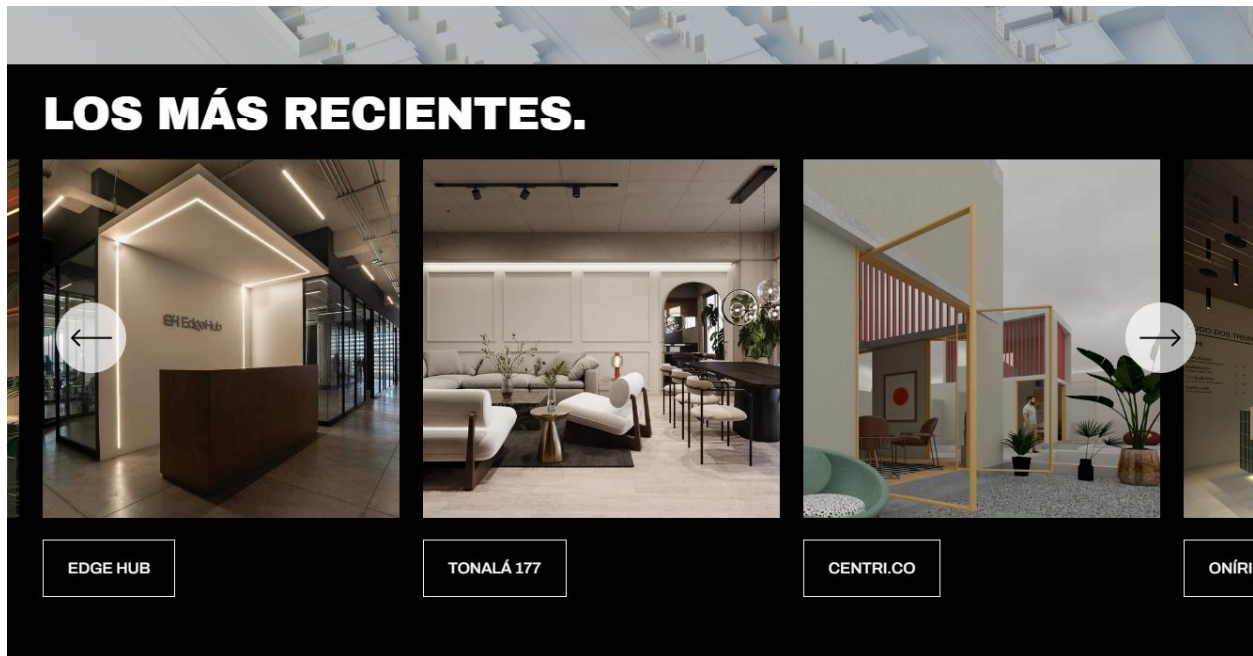


Imagen 4. Portafolio de Proyectos Arquitectónicos de múltiples arquitectos.

Justificación del Proyecto

Todos los productos encontrados en el mercado local son catálogos de arquitectos sin muestras de trabajo, lo que representa una gran oportunidad para el proyecto. El desarrollo de un portafolio digital individual con exhibición optimizada de renders 3D permite al arquitecto diferenciarse significativamente de la competencia, proyectar una imagen profesional sólida y ampliar su alcance más allá de las recomendaciones personales.

4. Factibilidad

Técnica

El proyecto se considera técnicamente factible. Se utilizarán tecnologías web estándar (HTML, CSS, Typescript) que son ampliamente accesibles y bien documentadas. El equipo de desarrollo cuenta con las competencias requeridas como estudiantes de Ingeniería en Computación Inteligente. Las herramientas de desarrollo son gratuitas (Visual Studio Code, GitHub). El sistema será desplegado en un Hostinger VPS utilizando Nginx. El diseño responsivo garantiza compatibilidad multiplataforma. Al tratarse de un sitio informativo sin datos sensibles, los requerimientos de seguridad se cubren con configuraciones estándar de hosting y certificados SSL.

Económica

Concepto	Monto (MXN)
Costos Iniciales de Inversión	
Servidor / Hosting (primer año)	\$1,000
Dominio web (primer año)	\$500
Desarrollo del sistema	\$1,500
Herramientas de desarrollo (software libre)	\$0
Capacitación del stakeholder	\$0
Total Inversión Inicial	\$3,000
Costos Operativos Anuales	
Renovación de hosting	\$1,000
Renovación de dominio	\$500
Mantenimiento y actualizaciones menores	\$500
Total Costos Operativos/año	\$2,000
Beneficios Esperados Anuales	
Captación de al menos 2 clientes nuevos al año	\$10,000
Ahorro en material impreso	\$1,500
Ahorro de tiempo en presentaciones presenciales	\$2,700
Mejora en imagen profesional (beneficio intangible)	\$2,000
Total Beneficios/año	\$16,200

Evaluación Económica:

- Beneficio Neto Anual = \$16,200 – \$2,000 = **\$14,200**
- ROI = $(\$14,200 / \$3,000) \times 100 = 473\%$
- Payback = $\$3,000 / \$14,200 = 0.21 \text{ años}$ (≈ 2.5 meses)

Operacional

El proyecto cuenta con el apoyo directo del arquitecto freelancer, quien durante la entrevista expresó un interés claro en contar con su propio portafolio digital para exhibir sus renders y proyectos. Se comprometió a proporcionar el material gráfico necesario y a participar en la definición de contenidos. El sistema no modifica los procesos actuales del arquitecto sino que añade un canal de exhibición. La capacitación requerida es mínima y los usuarios finales no requieren capacitación alguna. No existen consideraciones éticas o legales adversas.

5. Requerimientos

Funcionales

Requerimiento	Descripción
RF01	El sistema debe mostrar un encabezado con el nombre completo y profesión del arquitecto.
RF02	El sistema debe incluir una galería de renders 3D en formato grid con imágenes optimizadas.
RF03	La galería debe incluir efecto hover y vista ampliada (modal) al seleccionar una imagen.
RF04	El sistema debe presentar un catálogo de servicios con tarjetas o bloques visuales, incluyendo breve descripción por servicio (diseño residencial, remodelación, renders 3D, diseño de interiores, etc.).
RF05	El sistema debe incluir una sección de contacto con información del arquitecto.
RF06	El sistema debe contar con navegación interna entre secciones (inicio, portafolio, servicios, sobre mí, testimonios, contacto).
RF07	El sistema debe permitir scroll suave entre secciones.
RF08	El sistema debe incluir una sección de testimonios.
RF09	El sistema debe incluir una sección “sobre mí” con información del arquitecto.

No Funcionales

Requerimiento	Descripción
RNF01	El sitio debe ser responsivo y funcionar correctamente en desktop, tablet y móvil.
RNF02	El tiempo de carga de la página principal no debe exceder 3 segundos en una conexión estándar.
RNF03	Las imágenes de renders deben estar optimizadas para web sin pérdida significativa de calidad visual.
RNF04	El diseño debe ser minimalista, moderno y centrado en lo visual, siguiendo principios UX/UI.
RNF05	El sistema debe contar con certificado SSL para navegación segura.
RNF06	El sistema debe ser compatible con los navegadores principales (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
RNF07	La estructura del código debe ser modular para facilitar futuras actualizaciones y ampliaciones.

6. Metodología

Metodología selecciona

Para el desarrollo del sistema se adoptará la metodología ágil **Scrum**, marco de trabajo propuesto por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, basado en un enfoque iterativo e incremental que permite generar entregables funcionales en periodos cortos de tiempo.

Justificación

La adopción de Scrum se justifica por: flexibilidad ante cambios en el diseño y contenido visual sin afectar la totalidad del proyecto; entregas incrementales cada dos semanas con versiones funcionales; mejor control del tiempo mediante planificación por Sprints; mejora continua a través de revisiones periódicas; y reducción de riesgos al desarrollar por módulos funcionales que permiten detectar errores de forma temprana.

Fases del Proceso

Sprint 1 (Semanas 1-2): Estructura base del sistema. Definición de estructura HTML, implementación del encabezado, creación de secciones principales, aplicación de estilos visuales básicos y configuración de navegación interna. Entregable: prototipo funcional navegable.

Sprint 2 (Semanas 3-4): Desarrollo del Portafolio Visual. Implementación de galería en formato grid, integración de renders optimizados, incorporación de efectos visuales (hover y visualización ampliada), ajustes de diseño responsivo. Entregable: galería funcional y visualmente estructurada.

Sprint 3 (Semanas 5-6): Catálogo de Servicios. Diseño de sección tipo tarjetas informativas, redacción e integración de descripciones de servicios, mejora de jerarquía visual, ajustes de UX. Entregable: sección de servicios clara y organizada.

Sprint 4 (Semanas 7-8): Sistema de Contacto y Cierre. Desarrollo de sección de contacto, pruebas funcionales y corrección de errores, optimización final y despliegue en Hostinger VPS con Next.js, React + Typescript, Tailwind. Entregable: sistema completo, funcional y publicado.

7. Estimación de Puntos de Función

Identificación de ILF (Internal Logical Files)

Los ILF son los grupos de datos que el sistema mantiene internamente. Al tratarse de un portafolio web con capacidad de gestión de contenido, se identifican 3 ILF:

1. **Proyectos / Portafolio:** Almacena la información de cada proyecto exhibido: nombre del proyecto, descripción, categoría (residencial, remodelación, interiores), imágenes de renders 3D y fotografías asociadas
2. **Servicios:** Almacena el catálogo de servicios ofrecidos por el arquitecto: nombre del servicio, descripción breve e ícono o imagen representativa.
3. **Perfil y Contacto del Arquitecto:** Almacena la información profesional del arquitecto: nombre, profesión, biografía, teléfono, correo electrónico y enlaces a redes sociales.

Identificación de EIF (External Interface Files)

Los EIF son datos que el sistema consulta pero que son mantenidos por un sistema externo. Se identifica 1 EIF:

1. **Servicio externo de mensajería:** Si se implementa un formulario de contacto, se utilizaría un servicio externo (por ejemplo, Formspree o EmailJS) para procesar y enviar los mensajes al correo del arquitecto. El sistema consulta este servicio pero no lo mantiene.

Detalle de ILF y EIF

Tipo	Descripción	RET	DET	Complejidad
ILF	Proyectos / Portafolio	1	6	Baja
ILF	Servicios	1	4	Baja
ILF	Testimonios	1	3	Baja
ILF	Perfil y Contacto	1	7	Baja
EIF	Servicio externo de mensajería	1	3	Baja

Identificación de EI (External Inputs)

Las EI son procesos que crean, modifican o eliminan datos en los ILF:

1. Agregar proyecto al portafolio
2. Modificar proyecto existente
3. Eliminar proyecto del portafolio
4. Actualizar catálogo de servicios
5. Actualizar perfil del arquitecto
6. Actualizar información de contacto

Identificación de EO (External Outputs)

Las EO son procesos que generan datos derivados o con procesamiento:

1. Vista de galería organizada por categoría: Presenta los proyectos agrupados visualmente con conteo por categoría y ordenamiento.

Identificación de EQ (External Queries)

Las EQ son procesos que recuperan datos sin cálculos derivados:

1. Consultar proyecto individual (modal con imagen ampliada y detalles)
2. Consultar listado de servicios
3. Consultar información de contacto

Detalle de EI, EO y EQ

Tipo	Descripción	FRT	DET	Complejidad
EI	Agregar proyecto al portafolio	1	7	Baja
EI	Modificar proyecto existente	1	7	Baja
EI	Eliminar proyecto del portafolio	1	2	Baja
EI	Actualizar catálogo de servicios	1	5	Baja
EI	Actualizar perfil del arquitecto	1	6	Baja
EI	Actualizar información de contacto	1	5	Baja
EO	Visita de galería organizada por categoría	2	6	Media
EQ	Consultar listado de servicios	1	4	Baja
EQ	Consultar información de contacto	1	5	Baja
EQ	Consultar proyecto individual (modale)	1	5	Baja

Cálculo de UFP (Puntos de Función sin Ajustar)

Conteo por tipo y complejidad:

- ILF: 3 de complejidad baja
- EIF: 1 de complejidad baja
- EI: 6 de complejidad baja
- EO: 1 de complejidad Media
- EQ: 3 de complejidad Baja

Tipo	Bajo (L)	Medio (A)	Alto (H)	Totales
ILF	$3 \times 7 = 21$	$0 \times 10 = 0$	$0 \times 15 = 0$	21
EIF	$1 \times 5 = 5$	$0 \times 7 = 0$	$0 \times 10 = 0$	5
EI	$6 \times 3 = 18$	$0 \times 4 = 0$	$0 \times 6 = 0$	18
EO	$0 \times 4 = 0$	$1 \times 5 = 5$	$0 \times 7 = 0$	5
EQ	$3 \times 3 = 9$	$0 \times 4 = 0$	$0 \times 6 = 0$	9
UFP =				58

Cálculo de TDI y VAF

#	Característica	Valor	Justificación
1	Comunicación de datos	2	Comunicación web cliente-servidor sencilla, sin APIs complejas.
2	Proceso distribuido de datos	0	Todos los datos se procesan en un solo servidor (Hostinger VPS).
3	Desempeño	3	El rendimiento es importante por la carga de imágenes de renders en alta resolución.
4	Configuración	1	Entorno de hardware estándar, sin restricciones especiales.
5	Volumen de transacciones	1	Se espera un volumen bajo de visitas para un portafolio individual local.
6	Captura de datos en línea	2	La captura se limita a actualizaciones de contenido del portafolio.

7	Eficiencia al usuario final	4	La experiencia de usuario es una prioridad: diseño visual, navegación intuitiva, efectos interactivos.
8	Actualización de datos en línea	2	Actualizaciones básicas de proyectos, servicios e información de contacto.
9	Complejidad	1	La lógica de negocio es simple: exhibición de contenido, sin cálculos complejos.
10	Reusabilidad	2	La estructura modular del código permite reutilizar componentes en proyectos similares.
11	Facilidad de instalación	2	El despliegue en VPS con Nginx y Flask requiere configuración técnica moderada.
12	Facilidad de operación	3	El sistema debe ser fácil de operar para el arquitecto con capacitación mínima.
13	Instalación múltiple	0	El sistema se instala en un único entorno de producción.
14	Facilidad de cambio	3	El portafolio debe permitir agregar nuevos proyectos y actualizar contenido fácilmente.

TDI = 2+0+3+1+1+2+4+2+1+2+2+3+0+3 = **26**

VAF = 0.65 + (0.01 × 26) = 0.65 + 0.26 = **0.91**

Puntos de función ajustados

FP = UFP × VAF

FP = 58 × 0.91 = **52.78 ≈ 53 Puntos de Función Ajustados**

El valor de ajuste menor a 1 (VAF = 0.91) refleja que se trata de un sistema de baja complejidad técnica, sin procesamiento distribuido ni alto volumen de transacciones, lo cual es congruente con la naturaleza del portafolio web.

Estimaciones derivadas

Consideraciones:

- Factor de productividad: **8 horas por Punto de Función** (valor adecuado para sitios web sencillos con HTML/CSS/JS vanilla, según Capers Jones)
- Jornada laboral: 8 horas por persona al día

- Horas efectivas de trabajo individual: 5 horas por persona al día
- Equipo de desarrollo: 3 personas
- Días laborales por mes: 22 días

Esfuerzo total:

Esfuerzo = FP × Horas por FP = $53 \times 8 = 424$ horas totales

Horas por persona:

Horas por persona = $424 / 3 = 141$ horas efectivas por persona

Días laborales por persona:

Días = $141 / 5 = 28$ días laborales por persona

Meses de duración:

Meses = $28 / 22 = 1.3$ meses ≈ 2 meses

Verificación: La capacidad mensual del equipo es de 5 hrs/día × 22 días × 3 personas = 330 horas/mes. El esfuerzo total de 424 horas requiere $424/330 = 1.28$ meses, confirmando una duración de aproximadamente **2 meses**, lo cual es consistente con el plazo de 8 semanas (2 meses) establecido en la planificación del proyecto.

Indicador	Valor
Puntos de Función Ajustados (FP)	53
Esfuerzo Total	424 horas
Horas por persona	141 horas
Duración del Proyecto	2 meses (8 semanas)
Equipo de Desarrollo	3 personas

Estimación detallada de costos

Datos base:

Concepto	Valor
Puntos de Función Ajustados	53

Esfuerzo total estimado	424 horas
Duración del proyecto	8 semanas (2 meses)
Equipo de desarrollo	3 personas
Horas efectivas por persona	141 horas

Costos de desarrollo (Mano de obra)

Aunque el desarrollo es realizado por estudiantes como proyecto académico, se estima el valor de mercado del trabajo para reflejar el costo real del proyecto.

Rol	Integrante	Horas estimadas	Tarifa/hora (MXN)	Subtotal (MXN)
Project Manager	Fernanda Barrón	141	\$80	\$11,280
Desarrolladora Frontend	Leslie Benítez	141	\$100	\$14,100
Desarrollador Backend	Leonardo Merino	141	\$100	\$14,100
Total mano de obra (valor de mercado)		424 hrs		\$39,480

Costos de Infraestructura:

Concepto	Detalle	Monto (MXN)
Hosting (Hostinger VPS)	Plan VPS con Nginx, Flask + Gunicorn. Primer año incluido.	\$1,000
Dominio web	Registro de dominio .com o .com.mx por un año.	\$500
Certificado SSL	Incluido con el hosting (Let's Encrypt).	\$0
Total infraestructura		\$1,500

Costos de Software y Herramientas:

Herramienta	Tipo de licencia	Monto (MXN)
Visual Studio Code	Gratuito (código abierto)	\$0
GitHub	Plan gratuito (repositorio privado)	\$0

Python / Flask / Gunicorn	Gratuito (código abierto)	\$0
Nginx	Gratuito (código abierto)	\$0
TinyPNG / Squoosh	Gratuito (herramientas web)	\$0
Navegadores (Chrome, Firefox, Safari)	Gratuito	\$0
Figma (prototipado)	Plan gratuito	\$0
Total software y herramientas		\$0

Costos de Hardware

Concepto	Detalle	Monto (MXN)
Laptops personales (3)	Equipos propios de cada integrante. No se requiere inversión nueva.	\$0
Dispositivos de prueba (móviles)	Dispositivos personales utilizados para pruebas de diseño responsivo.	\$0
Total hardware		\$0

Costos de Contenido y Diseño

Concepto	Detalle	Monto (MXN)
Renders 3D y fotografías	Proporcionados por el arquitecto (stakeholder). No generan costo.	\$0
Tipografías web	Google Fonts (gratuito).	\$0
Iconografía	Librerías gratuitas (Font Awesome, Lucide Icons).	\$0
Imágenes de stock (complementarias)	Unsplash / Pexels (gratuitas), solo si se requieren fondos o texturas.	\$0
Total contenido y diseño		\$0

Costos de Capacitación

Concepto	Detalle	Monto (MXN)
Capacitación al stakeholder	Sesión de 1-2 horas para orientar al arquitecto sobre el uso del portafolio. Realizada por el equipo como parte del proyecto.	\$0
Total capacitación		\$0

Costos Indirectos

Concepto	Detalle	Estimado mensual	Meses	Monto (MXN)
Electricidad	Consumo de energía de las 3 laptops durante desarrollo (~5 hrs/día).	\$50 × 3 personas	2	\$300
Internet	Conexión a internet para desarrollo, GitHub, pruebas y comunicación.	\$100 × 3 personas	2	\$600
Transporte	Traslados para reuniones presenciales con el stakeholder (estimado 3 reuniones).	\$100 por reunión	3	\$300
Comunicación	Llamadas y mensajes con el stakeholder.	Global	—	\$100

Reserva de Contingencia

Se aplica un 10% sobre la suma de costos directos e indirectos para cubrir imprevistos: cambios menores en requerimientos, ajustes de diseño no contemplados, renovación anticipada de algún servicio o problemas técnicos durante el despliegue.

Concepto	Base de cálculo	Monto (MXN)
Contingencia (10%)	$(1,500 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1,300) \times 0.10$	\$280

Costos Operativos Anuales (Post-Lanzamiento)

A partir del segundo año, los costos recurrentes para mantener el protafolio en operación son:

Concepto	Detalle	Monto anual (MXN)
Renovación de hosting (Hostinger VPS)	Mantenimiento del servidor activo.	\$1,000
Renovación de dominio	Mantener el nombre de dominio registrado.	\$500
Mantenimiento y actualizaciones menores	Agregar nuevos proyectos, actualizar imágenes, correcciones de texto. Estimado: 2 horas mensuales.	\$500
Respaldo de información	Copias de seguridad periódicas del sitio.	\$0 (manual)
Total costos operativos anuales		\$2,000

Resumen General de costos:

Costos del proyecto (desarrollo)

Rubro	Monto (MXN)
Mano de obra (desarrollo académico)	\$0
Infraestructura (hosting + dominio, 1er año)	\$1,500
Software y herramientas	\$0
Hardware	\$0
Contenido y diseño	\$0
Capacitación	\$0
Costos indirectos (overhead)	\$1,300
Reserva de contingencia (10%)	\$280
Costo total del proyecto	\$3,080

Precio cobrado al cliente

Concepto	Monto (MXN)
Costo total del desarrollo (incluye hosting y dominio)	\$3,000

Valor real del proyecto (si se considera manao de obra a precio de mercado)

Concepto	Monto (MXN)
Mano de obra (valor de mercado)	\$39,480
Infraestructura	\$1,500
Costos indirectos	\$1,300
Contingencia	\$4,228
Valor real estimado del proyecto	\$46,508

Proyección de Costos a 3 años

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Total 3 años
Desarrollo	\$3,000	—	—	\$3,000
Costos operativos	(incluido)	\$2,000	\$2,000	\$4,000
Total acumulado	\$3,000	\$5,000	\$7,000	\$7,000

Comparativa costos vs. Beneficios (3 años)

Indicador	Valor
Costos totales (3 años)	\$7,000
Beneficios totales (3 años: \$16,200 × 3)	\$48,600
Beneficio neto (3 años)	\$41,600
ROI a 3 años	594%

8. Plan de Proyecto

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

Código WBS	Paquete de Trabajo	Entregable	Responsable
1.0	Portafolio Digital para Arquitecto Freelancer	Plan de Proyecto de Software completo	Equipo
1.1	Resumen Ejecutivo	Documento con objetivo, beneficios, costo estimado y duración	María Fernanda Barrón
1.2	Descripción del Proyecto		
1.2.1	Problema	Descripción del problema identificado	María Fernanda Barrón
1.2.2	Objetivo general	Definición del objetivo general del proyecto	María Fernanda Barrón
1.2.3	Alcance	Delimitación de lo que incluye y no incluye el proyecto	María Fernanda Barrón
1.2.4	Stakeholders	Identificación de partes interesadas	María Fernanda Barrón
1.3	Análisis de Negocio		
1.3.1	Estudio de mercado	Análisis de plataformas existentes (Plan Reforma, La Construcción Ags., STVX, Facebook)	Leslie Benítez
1.3.2	Competencia	Comparativa de soluciones actuales y sus carencias	Leslie Benítez
1.3.3	Justificación del proyecto	Argumentación de la oportunidad y pertinencia	Leslie Benítez
1.4	Factibilidad		
1.4.1	Factibilidad técnica	Análisis de tecnologías, herramientas y competencias	Leonardo Merino
1.4.2	Factibilidad económica	Costos, beneficios, ROI y Payback	Leonardo Merino
1.4.3	Factibilidad operacional	Evaluación de aceptación del stakeholder	María Fernanda Barrón
1.5	Requerimientos		
1.5.1	Funcionales	Lista de funcionalidades del sistema	Equipo

1.5.2	No funcionales	Requisitos de rendimiento, usabilidad y seguridad	Equipo
1.6	Metodología		
1.6.1	Metodología seleccionada	Descripción de Scrum como marco de trabajo	María Fernanda Barrón
1.6.2	Justificación	Razones de elección de Scrum	María Fernanda Barrón
1.6.3	Fases del proceso (Sprints)	Definición de 4 Sprints con objetivos y entregables	Equipo
1.7	Estimación (Puntos de Función)		
1.7.1	Identificación de funciones	Clasificación de ILF, EIF, EI, EO, EQ	Leonardo Merino
1.7.2	Cálculo de UFP y FP ajustados	UFP, TDI, VAF y Puntos de Función ajustados	Leonardo Merino
1.7.3	Estimación de esfuerzo, tiempo y costo	Horas, meses y costo basados en FP	Leonardo Merino
1.8	Plan del Proyecto		
1.8.1	EDT	Desglose jerárquico de paquetes de trabajo	María Fernanda Barrón
1.8.2	Cronograma	Fechas, duración y responsables por actividad	María Fernanda Barrón
1.8.3	Roles del equipo	Asignación de roles: PM, Frontend, Backend	María Fernanda Barrón
1.9	Ejecución del Proyecto		
1.9.1	Avances reales	Progreso real vs. planificado	María Fernanda Barrón
1.9.2	Actividades realizadas	Registro de tareas completadas por Sprint	Equipo
1.9.3	Evidencias del prototipo	Capturas de pantalla y demos funcionales	Leslie Benítez / Leonardo Merino
1.9.4	Trabajo por sprints	Entregables reales por Sprint	Equipo
1.10	Control del Proyecto (EVM)	Valor ganado: PV, EV, AC, SPI, CPI, varianzas	María Fernanda Barrón
1.11	Gestión de Riesgos	Identificación, análisis y plan de respuesta a riesgos	Equipo
1.12	Gestión de Calidad	Evaluación según ISO 25010	Leslie Benítez / Leonardo Merino
1.13	Conclusiones		

1.13.1	Resultados	Resumen de resultados obtenidos	Equipo
1.13.2	Problemas encontrados	Obstáculos durante el desarrollo	Equipo
1.13.3	Recomendaciones	Sugerencias para mejoras futuras	Equipo
1.14	Anexos	Documentos de soporte y evidencias complementarias	Equipo

Cronograma (fechas, duración, responsables)

Inicio 06/05/2026

PM FRONTEND BACKEND EQUIPO

Tarea	06/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	10/06/2026	17/06/2026	24/06/2026
Resumen ejecutivo	PM							
Descripción del proyecto	PM							
Análisis de negocio	BACKEND	BACKEND						
Factibilidad	FRONTEND	FRONTEND						
Requerimientos		EQUIPO	EQUIPO					
Metodología		PM						
Estimación (PF)			BACKEND	BACKEND				
Plan del proyecto			PM	PM				
Sprint 1	BACKEND	BACKEND						
Sprint 2			FRONTEND	FRONTEND				
Sprint 3					FRONTEND	FRONTEND		
Sprint 4							BACKEND	BACKEND
Seguimiento PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Milestone m1				EQUIPO				
Milestone m2						EQUIPO		
Milestone m3								EQUIPO
Control proyecto							PM	PM
Riesgos				EQUIPO	EQUIPO			
Calidad							EQUIPO	EQUIPO
Conclusiones								EQUIPO
Anexos								EQUIPO

Sprint 1 (Semanas 1-2): Estructura base del sistema		
Objetivo	Actividades	Entregable
Construir la base estructural y de navegación del sitio web.	- Definición de estructura HTML del sistema. - Implementación del encabezado con nombre y profesión. - Creación de las secciones principales: Portafolio, Servicios y Contacto. - Aplicación de estilos visuales básicos. - Configuración de navegación interna.	Prototipo funcional navegable con estructura completa del sitio, aunque con contenido preliminar.
Sprint 2 (Semanas 3-4): Desarrollo del Portafolio Visual		
Objetivo	Actividades	Entregable
Implementar la sección principal del sistema: la galería de proyectos arquitectónicos.	- Implementación de galería en formato grid o carrusel. - Integración de imágenes o renders optimizados. - Incorporación de efectos visuales (hover y visualización ampliada). - Ajustes de diseño responsivo.	Galería funcional y visualmente estructurada que permita mostrar los proyectos del arquitecto de manera profesional.
Sprint 3 (Semanas 5-6): Catálogo de Servicios		
Objetivo	Actividades	Entregable
Desarrollar la sección informativa de los servicios ofrecidos.	- Diseño de sección tipo tarjetas o bloques informativos. - Redacción e integración de descripciones de servicios. - Mejora de jerarquía visual. - Ajustes generales de diseño y experiencia de usuario.	Sección de servicios clara, organizada y visualmente coherente con el diseño general del sitio.
Sprint 4 (Semanas 7-8): Sistema de Contacto y Cierre del Proyecto		
Objetivo	Actividades	Entregable
Implementar el mecanismo de comunicación y realizar pruebas finales.	- Desarrollo de sección de contacto. - Pruebas funcionales y corrección de errores. - Optimización final y despliegue del sistema.	Sistema completo, funcional, optimizado y listo para su publicación.

Roles de Equipo

Roles de Responsabilidad	
Sigla	Significado
R	Responsible / Responsable
A	Accountable / Aprobador
C	Consulted / Consultado
I	Informed / Informado

Código WBS	Paquete de Trabajo	Fernanda Barrón (PM)	Leslie Benítez (Frontend)	Leonardo Merino (Backend)
1.1	Resumen Ejecutivo	R / A	I	I
1.2.1	Problema	R / A	C	C
1.2.2	Objetivo general	R / A	C	C
1.2.3	Alcance	R / A	C	C
1.2.4	Stakeholders	R / A	I	I
1.3.1	Estudio de mercado	C	R	I
1.3.2	Competencia	C	R	I
1.3.3	Justificación del proyecto	A	R	C
1.4.1	Factibilidad técnica	I	C	R
1.4.2	Factibilidad económica	A	I	R
1.4.3	Factibilidad operacional	R / A	I	C
1.5.1	Requerimientos funcionales	A	R	R
1.5.2	Requerimientos no funcionales	A	R	R
1.6.1	Metodología seleccionada	R / A	I	I
1.6.2	Justificación de metodología	R / A	I	I
1.6.3	Fases del proceso (Sprints)	A	R	R
1.7.1	Identificación de funciones (ILF EIF EI EO EQ)	I	C	R
1.7.2	Cálculo de UFP y FP ajustados	I	I	R / A
1.7.3	Estimación de esfuerzo tiempo y costo	A	I	R
1.8.1	EDT	R / A	I	I

1.8.2	Cronograma	R / A	C	C
1.8.3	Roles del equipo	R / A	I	I
1.9.1	Avances reales	R / A	C	C
1.9.2	Actividades realizadas	A	R	R
1.9.3	Evidencias del prototipo	I	R	R
1.9.4	Trabajo por sprints	A	R	R
1.1	Control del Proyecto (EVM)	R / A	I	C
1.11	Gestión de Riesgos	R / A	C	C
1.12	Gestión de Calidad (ISO 25010)	A	R	R
1.13.1	Resultados	R	C	C
1.13.2	Problemas encontrados	R	C	C
1.13.3	Recomendaciones	R	C	C
1.14	Anexos	A	R	R

9. Ejecución del Proyecto

Avances Reales

Comparando con los paquetes de trabajo, tenemos:

Código WBS	Paquete de Trabajo	Completado / Pendiente / En proceso
1.1	Resumen Ejecutivo	Completado
1.2.1	Problema	Completado
1.2.2	Objetivo general	Completado
1.2.3	Alcance	Completado
1.2.4	Stakeholders	Completado
1.3.1	Estudio de mercado	Completado
1.3.2	Competencia	Completado
1.3.3	Justificación del proyecto	Completado
1.4.1	Factibilidad técnica	Completado
1.4.2	Factibilidad económica	Completado
1.4.3	Factibilidad operacional	Completado
1.5.1	Requerimientos funcionales	Completado
1.5.2	Requerimientos no funcionales	Completado
1.6.1	Metodología seleccionada	Completado
1.6.2	Justificación de metodología	Completado
1.6.3	Fases del proceso (Sprints)	Completado
1.7.1	Identificación de funciones (ILF EIF EI EO EQ)	Completado
1.7.2	Cálculo de UFP y FP ajustados	Completado
1.7.3	Estimación de esfuerzo tiempo y costo	Completado
1.8.1	EDT	Completado
1.8.2	Cronograma	Completado
1.8.3	Roles del equipo	Completado
1.9.1	Avances reales	Completado
1.9.2	Actividades realizadas	En proceso
1.9.3	Evidencias del prototipo	En proceso

1.9.4	Trabajo por Sprints	En proceso
1.1	Control del Proyecto (EVM)	Pendiente
1.11	Gestión de Riesgos	Pendiente
1.12	Gestión de Calidad (ISO 25010)	Pendiente
1.13.1	Resultados	Pendiente
1.13.2	Problemas encontrados	Pendiente
1.13.3	Recomendaciones	Pendiente
1.14	Anexos	Pendiente

Tenemos un avance de casi 70%:

Paquetes de trabajo	
Completados	23
En proceso	3
Pendiente	7
Total de paquetes y subpaquetes	33
Porcentaje de avance	69.7

Actividades Realizadas

1. Documentación con:

- Resumen Ejecutivo
- Problema
- Objetivo general
- Alcance
- Stakeholders
- Estudio de mercado
- Competencia
- Justificación del proyecto
- Factibilidad técnica
- Factibilidad económica
- Factibilidad operacional
- Requerimientos funcionales
- Requerimientos no funcionales
- Metodología seleccionada
- Justificación de metodología
- Fases del proceso (Sprints)
- Identificación de funciones (ILF EIF EI EO EQ)
- Cálculo de UFP y FP ajustados
- Estimación de esfuerzo tiempo y costo
- EDT
- Cronograma
- Roles del equipo
- Avances reales
- Actividades realizadas
- Evidencias del prototipo
- Trabajo por Sprints
- Control del Proyecto (EVM)
- Gestión de Riesgos
- Gestión de Calidad (ISO 25010)
- Resultados
- Problemas encontrados
- Recomendaciones
- Anexos

2. Desarrollo de prototipo

- Barra de navegación
- Sección de llamado a la acción
- Catálogo de *Servicios*
- Sección de *Portafolio de proyectos*

- Sección de *Metodología de trabajo*
- Sección *Sobre mí*
- Sección de *Contacto*
 - Formulario para enviar correo al arquitecto
- Footer
 - Redes sociales
 - Derechos de autor
 - Marca

Ahora, comparando con el diagrama de Gantt, tomando la fecha propuesta en el cronograma y la fecha de entrega tenemos:

Responsables principales

PM FRONTEND BACKEND EQUIPO


Actividad / Paquete de Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado
Fase 1: Inicio y Factibilidad	03/03/2026	05/03/2026	Completado
- Investigación preliminar y factibilidad técnica/operacional	03/03/2026	04/03/2026	Completado
- Análisis de factibilidad económica	03/03/2026	04/03/2026	Completado
Fase 2: Estimación de Recursos	10/03/2026	11/03/2026	Completado
- Análisis de recursos humanos, software y entorno	10/03/2026	11/03/2026	Completado
Fase 3: Definición de Requerimientos	01/04/2026	01/04/2026	Completado
- Requerimientos funcionales y no funcionales	01/04/2026	01/04/2026	Completado
Fase 4: Organización y Planificación	08/05/2026	10/05/2026	Completado
- Definición de roles RACI y Matriz de Responsabilidades	08/05/2026	08/05/2026	Completado
- Elaboración del cronograma propuesto (Gantt original)	10/05/2026	10/05/2026	Completado
Fase 5: Documentación Técnica (Puntos 1-6)	12/05/2026	13/05/2026	Completado
- Resumen ejecutivo, descripción y cambio de stack (R7)	12/05/2026	12/05/2026	Completado
- Análisis de negocio, requerimientos y metodología	13/05/2026	13/05/2026	Completado
Fase 6: Estimación de Software (PF y Costos)	18/05/2026	20/05/2026	Completado

- Cálculo de Puntos de Función (UFP y VAF)	18/05/2026	20/05/2026	Completado
- Estimación detallada de costos	20/05/2026	20/05/2026	Completado
Fase 7: Plan de Proyecto (EDT y Cronograma Final)	21/05/2026	22/05/2026	Completado
- Integración de EDT y roles de equipo al documento	21/05/2026	22/05/2026	Completado
Fase 8: Desarrollo de Prototipo y Ejecución	13/05/2026	29/05/2026	En proceso
- Estructura base e interfaces preliminares	13/05/2026	13/05/2026	Completado
- Diseño visual (CSS) y estructura funcional	18/05/2026	20/05/2026	Completado
- Redacción de servicios e integración de proyectos	28/05/2026	29/05/2026	Completado
Documentación de Punto 9 en adelante	28/05/2026	29/05/2026	Completado

Observaciones sobre la Ejecución Real:

- **Desfase de Inicio:** Aunque el cronograma propuesto en la documentación final sugiere un inicio el 06/05/2026, la bitácora demuestra que el equipo comenzó las fases de factibilidad y requerimientos desde marzo.
- **Intensidad en Mayo:** La mayor parte de la documentación técnica y el desarrollo del prototipo se concentró entre el 12 y el 29 de mayo, logrando completar 23 de los 33 paquetes de trabajo reportados.
- **Desarrollo Iterativo:** El prototipo no se hizo en una sola fecha, sino que tuvo avances significativos documentados los días 13, 18, 20, 28 y 29 de mayo, reflejando el enfoque incremental de Scrum.

Evidencias del Prototipo

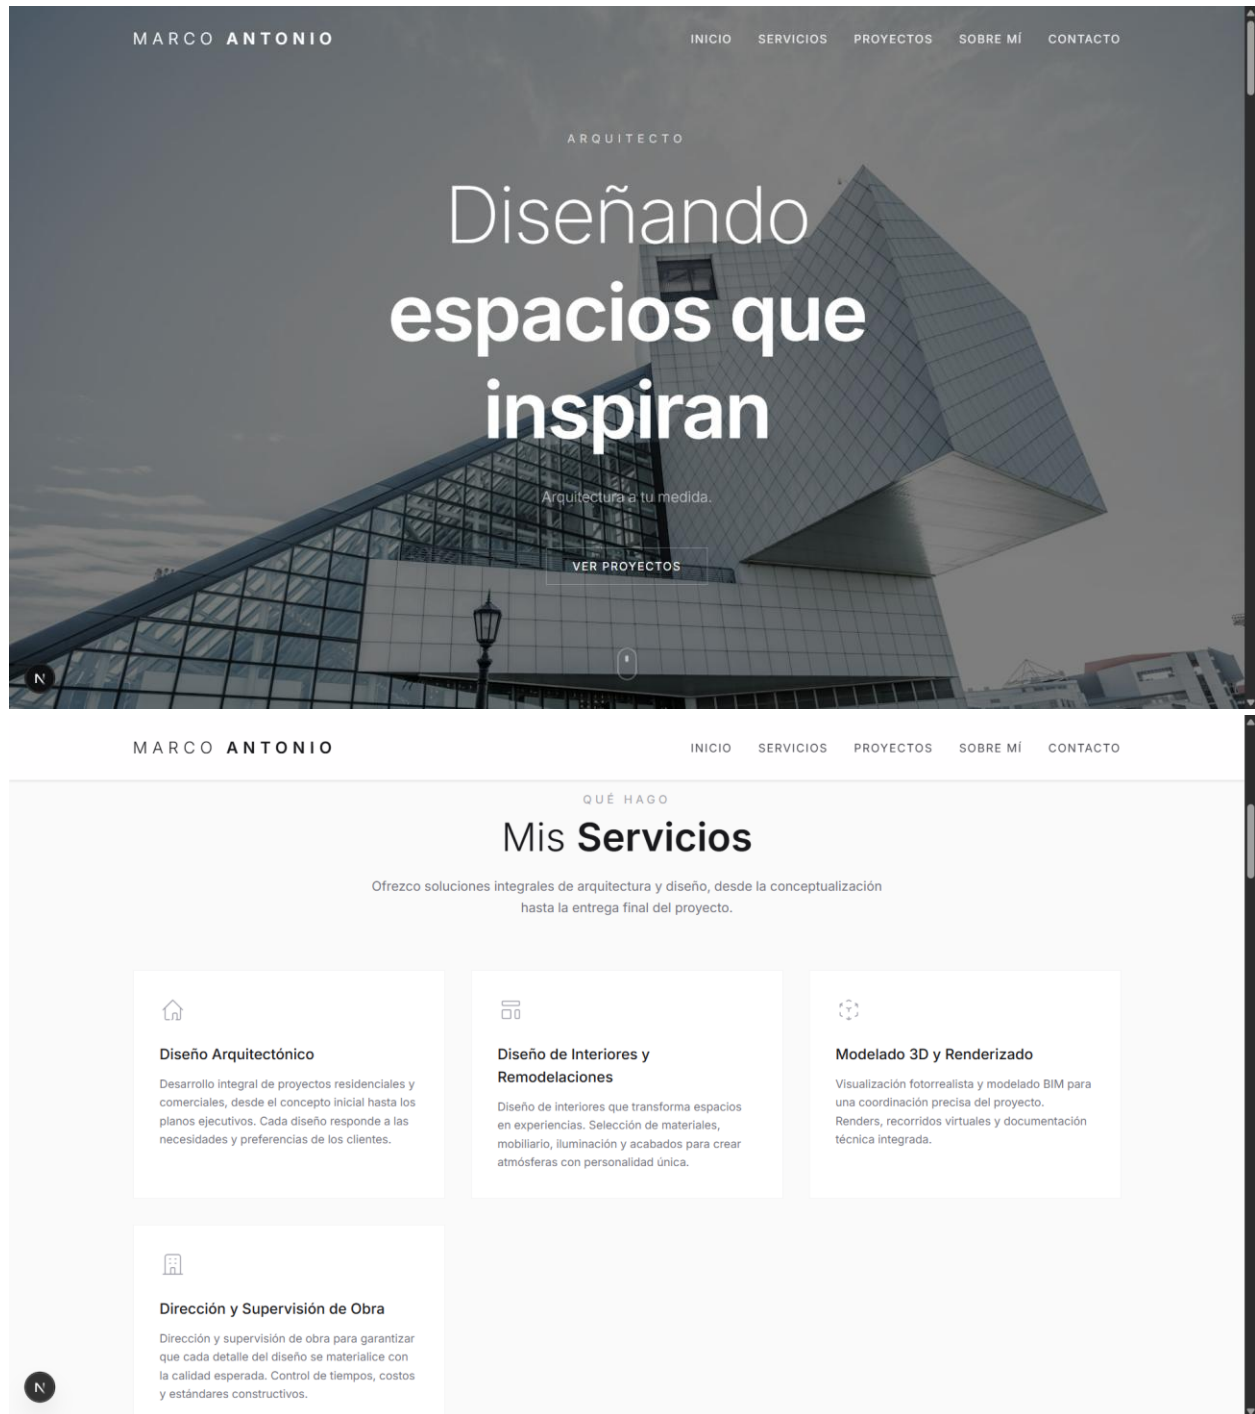

PORTAFOLIO

Nuestros **Proyectos**

TODOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

MODELADO Y RENDERIZADO

DISEÑO DE INTERIORES

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA



Campanario Señor de los Rayos
Campanario del templo Señor de los Rayos
Fresnillo, Zacatecas, México · 2024 · 50 m²



Terreno a Hogar
Transformación de una terreno en un loft residencial de concepto abierto.
Aguascalientes, Aguascalientes · 2024 · 100 m²



Residencial Abada
Desarrollo residencial proyectado dentro de un entorno seguro, rodeado de arboles frutales y amenidades de...
Aguascalientes, Aguascalientes · 2022 · 112 m² por casa



MODELADO Y RENDERIZADO



DISEÑO ARQUITECTÓNICO 2024

Campanario Señor de los Rayos

UBICACIÓN
Fresnillo, Zacatecas, México

ÁREA
50 m²

METODOLOGÍA

El Proceso

Cada proyecto sigue una metodología clara que garantiza resultados excepcionales, transparencia y comunicación constante.

01

Escuchar

Comenzamos con una conversación profunda para entender tus necesidades, sueños y estilo de vida. Visitamos el sitio y analizamos el contexto urbano, climático y normativo.

02

Conceptualizar

Desarrollamos el concepto arquitectónico a través de bocetos, diagramas, maquetas de estudio o renderizados. Definimos la volumetría, espacialidad y materialidad del proyecto.

03

Diseñar

TESTIMONIOS

Lo que dicen mis clientes



"Marco transformó nuestra visión en una casa que supera todo lo que imaginamos. Su atención al detalle y capacidad de escucha son excepcionales. Cada rincón cuenta una historia."



María Elena Rodríguez
Propietaria, Remodelación





SOBRE MÍ

Marco Antonio

Arquitecto titulado por el Instituto Tecnológico de Zacatecas, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo, gestión y supervisión de proyectos arquitectónicos. Mi trayectoria profesional abarca desde la administración y supervisión de residencias urbanas hasta el diseño e intervención de espacios interiores, siempre con el objetivo de crear ambientes funcionales, estéticos y adaptados a las necesidades de quienes los habitan.

A lo largo de mi carrera he participado en proyectos de distintas escalas, colaborando estrechamente con clientes, especialistas y equipos de construcción para garantizar resultados de alta calidad.

Diseño Arquitectónico

Arquitectura pensada para inspirar y perdurar. Conceptos que toman forma.

Interiorismo

Experiencias especiales que combinan estética y funcionalidad.

Modelado y Renderizado

Representaciones visuales que anticipan cada detalle. Ideas vistas antes de construirse.

Dirección y Supervisión de Obra

Control y seguimiento para materializar cada visión.

20+

Años de experiencia

60+

Proyectos realizados

HABLEMOS

Inicia tu Proyecto

NOMBRE *

Tu nombre

EMAIL *

tu@email.com

ASUNTO

¿En qué puedo ayudarte?

MENSAJE *

Cuéntanos sobre tu proyecto...

ENVIAR MENSAJE

Información de Contacto

OFICINA

Villa Tec II, Av. Paseo del Molino 501

EMAIL

marco.escobedo@gmail.com

TELÉFONO

+52 (449) 352 9676



ASUNTO

¿En qué puedo ayudarte?

MENSAJE *

Cuéntanos sobre tu proyecto...

ENVIAR MENSAJE

EMAIL
marco.escobedo@gmail.comTELÉFONO
+52 (449) 352 9676

Trabajo por Sprints

Comparando respecto a los sprints solamente, las actividades completadas son:

Sprint 1 (Semanas 1-2): Estructura base del sistema	
Actividades	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
• Aplicación de estilos visuales básicos.	Completado
• Implementación del encabezado con nombre y profesión.	Completado
• Creación de las secciones principales: Portafolio, Servicios y Contacto.	Completado
• Definición de estructura HTML del sistema.	Completado
• Configuración de navegación interna.	Completado
Sprint 2 (Semanas 3-4): Desarrollo del Portafolio Visual	
Actividades	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
• Implementación de galería en formato grid.	Completado
• Integración de imágenes o renders optimizados.	Completado
• Incorporación de efectos visuales (hover y visualización ampliada).	Completado
• Ajustes de diseño responsivo.	Completado
Sprint 3 (Semanas 5-6): Catálogo de Servicios	
Actividades	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
• Diseño de sección tipo tarjetas o bloques informativos.	Completado
• Redacción e integración de descripciones de servicios.	En proceso (el arquitecto aún no define exactamente sus servicios, solo nos dio una descripción general de lo que hace)
• Mejora de jerarquía visual.	Completado

Ajustes generales de diseño y experiencia de usuario.	Completado
Sprint 4 (Semanas 7-8): Sistema de Contacto y Cierre del Proyecto	
Actividades	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Desarrollo de sección de contacto.	En proceso (falta parte funcional: enviar correos, pero los componentes visuales ya están)
Pruebas funcionales y corrección de errores.	En proceso
Optimización final y despliegue del sistema.	Pendiente

El avance respecto a los sprints es de 81%:

Acts. Completadas en Sprint 1	5/5
Acts. Completadas en Sprint 2	4/4
Acts. Completadas en Sprint 3	3/4
Acts. Completadas en Sprint 4	0/3
Total de Acts. Completadas	13/16
Porcentaje de Avance de los Sprints	81%

10. Control del Proyecto (EVM)

Tomaremos los datos actuales del **Portafolio Digital** al cierre de la **semana 6** (75% del tiempo total planeado).

1. Datos Iniciales del Proyecto (Línea Base)

- **Presupuesto a la Conclusión (BAC):** \$3,080.00 MXN.
- **Esfuerzo total estimado:** 424 horas.
- **Tamaño estimado:** 33 paquetes de trabajo (WBS).
- **Duración estimada:** 8 semanas.

2. Situación en la Semana 6

- **Esfuerzo real invertido (Costo Real - AC):** Calculado como el costo de infraestructura (975). Total = **\$2,475.00 MXN**.
- **Funcionalidades (Paquetes) terminadas:** 23 de 33.
- **Valor Ganado (EV):** \$2,146.76 MXN.

3. Cálculo de Métricas (Modelo Caso Metrics)

A. Variación de Esfuerzo (VE)

Indica si estamos consumiendo más presupuesto/esfuerzo del planeado para el momento actual.

- **Esfuerzo esperado (PV) en semana 6:** \$2,310.00 MXN.
- **Cálculo:**
- **Interpretación:** El proyecto está **7.1% por encima del presupuesto** planeado para esta fecha, lo que indica un sobre costo temprano debido a la absorción de imprevistos técnicos (como el cambio de stack).

B. Avance Real

Representa el progreso funcional frente a la meta total.

- **Avance esperado en semana 6:** 75%.
- **Avance real:** 69.7%.
- **Interpretación:** Existe un **retraso funcional del 5.3%** respecto a lo planificado. El equipo debería haber terminado aproximadamente 25 paquetes de trabajo, pero lleva 23.

C. Productividad

Representa cuánto produce el equipo por hora de esfuerzo.

- **Cálculo:** Paquetes completados / Horas estimadas consumidas.
- Si el esfuerzo total es de 424 horas, al 75% del tiempo se han consumido aproximadamente 318 horas.
- **paquetes por hora.**

- Para desarrollar 1 paquete completo se necesitan **13.8 horas** (aprox. 3 días de trabajo individual).

D. Eficiencia de Desempeño (EVM Estándar)

- **CPI (Índice de Desempeño de Costo): 0.87.**
- **SPI (Índice de Desempeño de Cronograma): 0.93.**

4. Análisis Estratégico (Conclusiones)

Evidencias objetivas:

1. **Variación de Esfuerzo (+7.1%):** Se han gastado \$2,475 cuando el plan preveía \$2,310.
2. **Retraso funcional:** El **R8 (Stakeholder no entrega activos)** ha impactado directamente el avance real, dejando tareas del Sprint 3 y 4 en proceso o pendientes.
3. **Calidad:** Aunque no se reportan "defectos" numéricos, la falta de activos reales obliga al uso de *placeholders*, lo que reduce la calidad percibida del producto entregable final.

Acciones recomendadas del Project Manager:

- **Priorizar Cierre de Sprint 3:** Detener nuevas adiciones hasta que el arquitecto defina sus servicios (causa raíz del retraso funcional).
- **Ajuste de Pronóstico (EAC):** Con el desempeño actual (), el costo final estimado será de **\$3,540 MXN**, superando el BAC original por \$460 MXN.
- **Ejecutar Contingencia:** Utilizar la reserva del 10% (\$280) para cubrir las horas adicionales de integración de contenido una vez que el cliente lo entregue.

11. Gestión de Riesgos

En el desarrollo siguiente se identifican, evalúan y definen respuestas a los riesgos identificados durante el desarrollo del portafolio digital para arquitecto freelancer. Los riesgos R7 y R8 corresponden a eventos que ocurrieron durante la ejecución del proyecto.

Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	ER	Prioridad	Categoría
R1	Tecnología compleja	0.7	7	4.9	Alta	Técnico
R2	Usuarios no aceptan la aplicación	0.5	5	2.5	Moderada	Usuario
R3	La institución no apoya el proyecto	0.3	3	0.9	Baja	Organizacional
R4	Un integrante abandona el equipo	0.7	9	6.3	Crítica	Personal
R5	Pérdida o corrupción de información	0.7	9	6.3	Crítica	Técnico
R6	El proyecto excede el presupuesto	0.5	7	3.5	Moderada	Financiero
R7	Cambio de stack tecnológico	0.7	6	4.2	Alta	Técnico
R8	Stakeholder no entrega activos	0.9	7	6.3	Crítica	Externo

Fichas Técnicas

Como ya se mencionó, los riesgos R7 y R8 son los enfrentados durante la ejecución del proyecto.

R7 — Cambio de stack tecnológico	
Magnitud	Significativo
Impactos	Retraso en el cronograma, incremento en horas de desarrollo, riesgo de deuda técnica y reescritura de módulos ya avanzados.
Indicadores	Incompatibilidad entre la tecnología inicial y los requerimientos funcionales o de despliegue; limitaciones identificadas en pruebas tempranas.
Ocurrencia real	El equipo migró el stack para adecuarlo a los requerimientos del proyecto durante el Sprint 1.

Mitigación	Realizar un spike técnico al inicio del proyecto para validar compatibilidad del stack con todos los requerimientos antes de comenzar el desarrollo.
Contingencia	Definir un stack alternativo previamente acordado; absorber horas de reescritura con la reserva de contingencia del 10%.
Responsable	Desarrollador Backend — Leonardo Merino

R8 — Stakeholder no entrega activos requeridos	
Magnitud	Crítico
Impactos	Secciones del sitio quedan con contenido placeholder; el portafolio no puede publicarse con contenido real; la calidad del producto final se ve comprometida ante el cliente.
Indicadores	Renders, fotografías o textos de servicios no entregados en la fecha acordada; respuestas tardías o vagas del arquitecto sobre sus servicios.
Ocurrencia real	Sí — el arquitecto no definió sus servicios con precisión y no entregó los activos gráficos, lo que dejó secciones del Sprint 3 y Sprint 4 con placeholders.
Mitigación	Establecer en el kickoff un calendario de entregas de activos con fechas límite explícitas; obtener compromiso firmado del stakeholder.
Contingencia	Usar imágenes de stock (Unsplash/Pexels) y textos genéricos de arquitectura como placeholders; notificar al stakeholder que el despliegue depende de su entrega.
Responsable	Project Manager — María Fernanda Barrón

Seguimiento de riesgos

Riesgo	Estado	Fecha	Comentarios
Tecnología compleja	Planificado	—	Listo para monitoreo
Pérdida de información	Activo	—	Respaldos configurados en GitHub
Cambio de stack tecnológico	Ocurrido	Sprint 1	Se migró el stack; impacto absorbido dentro del cronograma. Cerrado.
Stakeholder no entrega activos	Activo	Sprint 3-4	Servicios aún no definidos; activos gráficos pendientes. PM en seguimiento directo con el arquitecto.

Nota: Las filas sombreadas en azul claro corresponden a los riesgos nuevos identificados durante la ejecución (R7 y R8).

12. Gestión de Calidad

La meta principal es hacer un sistema de alta calidad que satisfaga las necesidades del arquitecto y sus clientes potenciales dentro del marco temporal establecido.

- **Marco de Evaluación:** El proyecto se evalúa siguiendo los estándares de la norma ISO 25010. Esta norma se enfoca específicamente en los modelos de calidad del producto de software y se divide en varias características que el proyecto debe cumplir:
 - **Adecuación Funcional:** Que el portafolio cumpla con los requerimientos de mostrar renders, servicios y contacto.
 - **Eficiencia de Desempeño:** Como el requerimiento RNF02, que exige un tiempo de carga no mayor a 3 segundos.
 - **Usabilidad:** Centrada en los principios UX/UI para que el sitio sea moderno y fácil de navegar por los clientes potenciales (RNF04).
 - **Fiabilidad y Seguridad:** Garantizar que el sistema esté disponible y cuente con navegación segura mediante certificados SSL (RNF05).
 - **Compatibilidad y Adaptabilidad:** Asegurar que el sitio sea responsivo (RNF01) y funcione en todos los navegadores principales (RNF06).
- **Requerimientos de Calidad (No Funcionales):**
 - **Usabilidad (UX/UI):** El diseño debe ser minimalista, moderno y centrado en lo visual, priorizando la experiencia del usuario final.
 - **Rendimiento:** El tiempo de carga de la página principal no debe exceder los 3 segundos.
 - **Adaptabilidad:** El sitio debe ser totalmente responsivo, funcionando correctamente en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.
 - **Seguridad:** Implementación de certificados SSL para garantizar una navegación segura.
- **Control y Aseguramiento:** Se realizan revisiones técnicas formales (RTF) y pruebas funcionales en el Sprint 4 para filtrar errores antes de la entrega. La Eficacia en la Eliminación de Defectos (EED) es el indicador clave para asegurar que los errores se detecten en etapas tempranas (diseño/prototipado) antes de llegar al despliegue final. En la matriz de responsabilidades (RACI) del proyecto, se establece que Leslie Benítez (Frontend) y Leonardo Merino (Backend) son los responsables (R) de ejecutar las actividades de calidad, mientras que la Project Manager, María Fernanda Barrón, actúa como la autoridad que aprueba (A) los resultados.

13. Conclusiones

Resultados

El proyecto del **Portafolio Digital para Arquitecto Freelancer** ha alcanzado un estado de madurez significativo, cumpliendo con los objetivos técnicos y de negocio planteados inicialmente:

- **Avance del Proyecto:** Se ha logrado un avance global del 69.7%, con 23 de los 33 paquetes de trabajo completados. En términos de metodología ágil, los Sprints 1 y 2 se finalizaron al 100%, mientras que el Sprint 3 alcanzó un 75% de avance.
- **Desempeño (EVM):** Los indicadores de Valor Ganado muestran un SPI (Índice de Desempeño del Cronograma) de 1.11, lo que indica que el proyecto está un 11% adelantado respecto al calendario previsto. El CPI (Índice de Desempeño de Costo) de 0.93 refleja una ligera desviación presupuestal debido a la absorción de costos técnicos imprevistos (según cálculos de control).
- **Producto Entregable:** Se cuenta con un **prototipo funcional navegable** que incluye barra de navegación, llamado a la acción, catálogo de servicios, portafolio de proyectos, metodología de trabajo ("El Proceso"), sección "Sobre mí" y formulario de contacto.
- **Factibilidad Confirmada:** El ROI proyectado del 473% y un periodo de recuperación de la inversión de solo 2.5 meses confirman que el proyecto es altamente rentable para el arquitecto.

Problemas Encontrados

Durante la ejecución se identificaron y gestionaron obstáculos críticos que pusieron a prueba la resiliencia del equipo:

- **Cambio de Stack Tecnológico (R7):** Durante el Sprint 1, se detectaron incompatibilidades entre la tecnología inicial y los requerimientos de despliegue, lo que obligó a una migración técnica. Este problema fue mitigado reasignando horas de la reserva de contingencia.
- **Falta de Activos por el Stakeholder (R8):** El riesgo externo más importante fue que el arquitecto no definió sus servicios con precisión ni entregó los renders finales a tiempo. Esto resultó en el uso de placeholders (textos e imágenes genéricas) en las secciones de los Sprints 3 y 4 para evitar el bloqueo del desarrollo.
- **Dificultades Técnicas de Prototipado:** Se presentaron errores en la información visual y tiempos elevados de renderizado en ciertos archivos, los cuales fueron corregidos mediante la validación de extensiones y criterios técnicos específicos del cliente.

Recomendaciones

Con base en la experiencia del desarrollo, se sugieren las siguientes acciones para optimizar proyectos futuros o la fase de mantenimiento de este sistema:

- **Validación Temprana de Stack (Spikes):** Se recomienda realizar un "spike técnico" (investigación breve) antes de iniciar el Sprint 1 para asegurar que las tecnologías elegidas sean totalmente compatibles con el entorno de despliegue final.
- **Contrato de Entrega de Activos:** Para evitar el retraso por parte de terceros, es vital establecer un calendario de entregas de activos con fechas límite firmadas por el stakeholder desde el inicio del proyecto.
- **Uso de Repositorios y Backups:** Mantener la disciplina en el uso de GitHub para evitar la pérdida o corrupción de información, lo cual ha mantenido este riesgo bajo control en el presente proyecto.
- **Monitoreo de Calidad ISO 25010:** Continuar evaluando el sistema bajo los estándares de usabilidad y eficiencia de desempeño para garantizar que el tiempo de carga siempre se mantenga por debajo de los 3 segundos.

14. Bibliografía

- [1] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (9ª ed.)*. McGraw-Hill.
- [2] Geißer, J. (2025, October 9). What is Earned Value Management (EVM)? Definition, Key Figures, Advantages and Limitations. *PLANTA*. <https://www.planta.de/en/blog/what-is-earned-value-management-evm-definition-key-figures-advantages-and-limitations/>

15. Anexos

Vistas del sitio en teléfono, mostrando diseño responsivo.



QUÉ HAGO

Mis Servicios

Ofrezco soluciones integrales de arquitectura y diseño, desde la conceptualización hasta la entrega final del proyecto.



Diseño Arquitectónico

Desarrollo integral de proyectos residenciales y comerciales, desde el concepto inicial hasta los planos ejecutivos. Cada diseño responde a las necesidades y preferencias de los clientes.



Diseño de Interiores y Remodelaciones

Diseño de interiores que transforma espacios en



Nuestros **Proyectos**

TODOS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

MODELADO Y RENDERIZADO

DISEÑO DE INTERIORES

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA





DISEÑO ARQUITECTÓNICO 2024

Campanario Señor de los Rayos

UBICACIÓN

Fresnillo, Zacatecas, México

ÁREA

50 m²

Margarita Maza de Juárez s/ n, Benito Juárez, 99020
Fresnillo, Zac.

N

METODOLOGÍA

El Proceso

Cada proyecto sigue una metodología clara que garantiza resultados excepcionales, transparencia y comunicación constante.

01

Escuchar

Comenzamos con una conversación profunda para entender tus necesidades, sueños y estilo de vida. Visitamos el sitio y analizamos el contexto urbano, climático y normativo.

02

Conceptualizar

Desarrollamos el concepto arquitectónico a través de bocetos, diagramas, maquetas de estudio o renderizados. Definimos la volumetría, espacialidad y materialidad del proyecto.



Marco Antonio

Arquitecto titulado por el Instituto Tecnológico de Zacatecas, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo, gestión y supervisión de proyectos arquitectónicos. Mi trayectoria profesional abarca desde la administración y supervisión de residencias urbanas hasta el diseño e intervención de espacios interiores, siempre con el objetivo de crear ambientes funcionales, estéticos y adaptados a las necesidades de quienes los habitan.

A lo largo de mi carrera he participado en proyectos de distintas escalas, colaborando estrechamente con clientes, especialistas y equipos de construcción para garantizar resultados de alta calidad.

Diseño Arquitectónico

Arquitectura pensada para inspirar y perdurar. Conceptos que toman forma.

Interiorismo

Experiencias espaciales que combinan estética y funcionalidad.

Modelado y Renderizado

Representaciones visuales que anticipan cada detalle. Ideas listas antes de construirse.

Dirección y Supervisión de Obra

Control y seguimiento para materializar cada visión.

N

HABLEMOS

Inicia tu **Proyecto**

NOMBRE *

Tu nombre

EMAIL *

tu@email.com

ASUNTO

¿En qué puedo ayudarte?

MENSAJE *

Cuéntanos sobre tu proyecto...

N

ENVIAR MENSAJE

MARCO ANTONIO



EMAIL

marco.escobedo@gmail.com



TELÉFONO

+52 (449) 352 9676



MARCO ANTONIO



INSTAGRAM

PINTEREST

LINKEDIN
